CASO 3 — Seguros Pacífico Sur

Compañía de seguros · portal de siniestros · 2,100 empleados · 45 personas en TI

El contexto

El equipo del portal de siniestros tiene 11 personas y trabaja en sprints de dos semanas. A primera vista ninguna etapa del proceso es lenta: nadie espera semanas por nada y las herramientas están razonablemente automatizadas.

Sin embargo, el gerente de TI midió el tiempo real entre el primer commit de una historia y su llegada a producción: el promedio del último trimestre fue de 21 días calendario. Nadie en el equipo logra explicar de dónde salen esos 21 días.

El equipo levantó el año pasado una medición de cuántos elementos pasan cada etapa a la primera, sin devoluciones ni correcciones. Esos porcentajes están en la tabla.

Cómo llega un cambio a producción

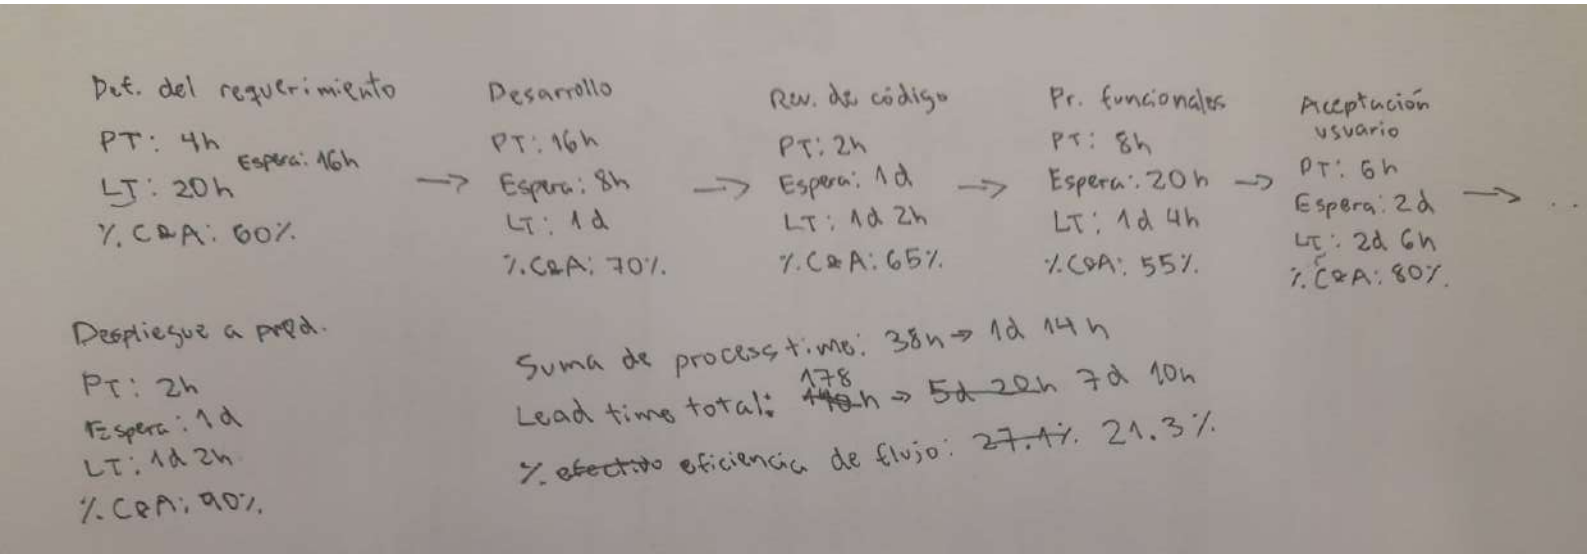
Etapa	Qué ocurre en esta etapa
Definición del requerimiento	El analista redacta la historia de usuario: unas 4 horas de trabajo, con una espera previa de 16 horas. De cada 10 historias, 4 son devueltas después por el desarrollador o por QA porque el criterio de aceptación era ambiguo o estaba incompleto.
Desarrollo	El desarrollador implementa: alrededor de 16 horas efectivas, con 8 horas de espera en la cola del sprint. 3 de cada 10 implementaciones deben rehacerse parcialmente por un malentendido funcional o por conflictos al integrar.
Revisión de código	La revisión toma unas 2 horas y el pull request espera cerca de 24 horas a ser atendido. 35 de cada 100 pull requests son rechazados y devueltos al autor.
Pruebas funcionales	QA prueba el cambio: 8 horas de trabajo, precedidas de 20 horas de espera. Casi la mitad de los elementos —45 de cada 100— regresan a desarrollo con defectos.
Aceptación del usuario	El área de siniestros valida en un ambiente de aceptación: 6 horas de trabajo del usuario y 2 días de espera hasta que consigue agenda. 2 de cada 10 validaciones terminan en rechazo y vuelven atrás.
Despliegue a producción	El despliegue está semiautomatizado y toma unas 2 horas, con 1 día de espera hasta la ventana. 1 de cada 10 despliegues falla y debe repetirse.

Lo que dice el equipo

> *Jefe de QA: «Necesito dos analistas más. No damos abasto con el volumen de defectos.»*
>
> *Desarrollador senior: «La mitad de mi semana la paso arreglando cosas que ya había dado por terminadas hace diez días. Cuando vuelvo al código ya ni me acuerdo qué hice.»*
>
> *Gerente de TI: «Si sumo el tiempo de todas las etapas me sale una semana. La medición dice 21 días. Alguien me está mintiendo o algo no estamos viendo.»*

Bitácora del último trimestre (90 días)

- Despliegues a producción en los últimos 90 días: 18.
- Despliegues que provocaron un incidente o requirieron corrección urgente: 5.
- Incidentes en producción y tiempo hasta restablecer el servicio: 2 h, 4 h, 3 h, 2 h y 4 h.
- Tiempo real medido entre el primer commit y la llegada a producción: 21 días calendario en promedio.
- Historias devueltas al menos una vez a una etapa anterior durante el trimestre: 76 de 94.


Def. del requerimiento
PT: 4h
Espera: 16h
LT: 20h
%. C&A: 60%.
Desarrollo
PT: 16h
Espera: 8h
LT: 1d
%. C&A: 70%.
Rev. de código
PT: 2h
Espera: 1d
LT: 1d 2h
%. C&A: 65%.
Pr. funcionales
PT: 8h
Espera: 20h
LT: 1d 4h
%. C&A: 55%.
Aceptación usuario
PT: 6h
Espera: 2d
LT: 2d 6h
%. C&A: 80%.
Despliegue a prod.
PT: 2h
Espera: 1d
LT: 1d 2h
%. C&A: 90%.
Suma de process time: 38h → 1d 14h
Lead time total: ~~178~~ 118h → ~~5d 22h~~ 7d 10h
%. ~~efectivo~~ eficiencia de flujo: ~~27.1%~~. 21.3%

Métrica DORA	Cálculo
Deployment Frequency	18 despliegues / 90 días = 1.4 despliegues por semana
Lead Time For changes	21 días calendario
Change Failure rate	5 despliegues con incidencia / 18 despliegues = 27.8%
Mean Time To restore	(2+4+3+2+4) / 5 → 15/5 = 3 horas
